
#### Инвестиционная деятельность ОАО «ДРСК» за 2011 год.

В 2011 году инвестиционной программой ОАО «ДРСК» предусмотрено 4 981 млн. руб. По итогам 1 полугодия 2011 г. проведена корректировка программы и согласована ОАО «РАО ЭС Востока» в составе бизнес-плана ОАО «ДРСК» (протокол Совета директоров  $\mathbb{N}$  14 от 20.10.11г.).

По итогам года фактическое освоение составило 4 939,5 млн. руб., или 99% от плана, в том числе по реконструкции и техперевооружению -2751,5 млн. руб. (102%), по новому строительству -1868,3 млн. руб. (88%). Приобретено объектов основных средств на сумму 319,7 млн. руб. (189%).


## Освоение инвестиций в 2011 году, млн. руб.

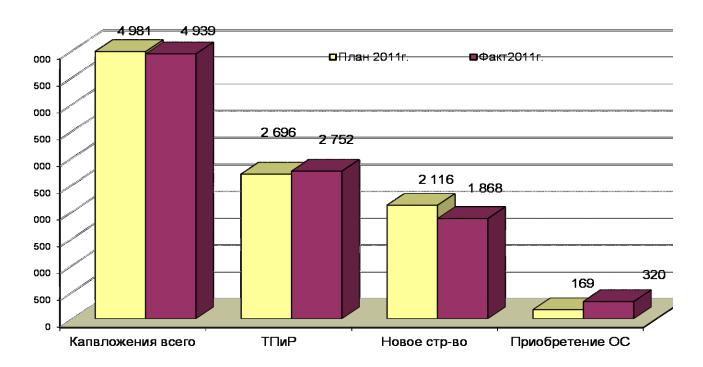

# Освоение инвестиций по филиалам ОАО «ДРСК», млн. руб.

		ЦРСК»		Амурские ЭС		Приморск ие ЭС		Хабаровс- кие ЭС		ЭС Еврейской АО		Южно- Якутские ЭС		Общесис -темные	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
ВСЕГО инвестиции, в т.ч.	4 981	4 939	986	996	2 613	2 491	812	934	270	223	274	277	24	18	
ТПиР	2 696	2 752	775	766	913	1 012	546	522	245	215	207	227	9	9	
Новое строитель- ство	2 116	1 868	129	138	1 636	1 413	258	268	17	0	60	43	15	5	
Приобрете- ние ОС	169	320	82	92	64	65	8	144	8	8	7	7	0	3	
% освоения плана	99	%	101	%	9:	5 %	11	5 %	104	%	101	l %	75	%	

#### Структура инвестиций в основной капитал, млн. руб. (без НДС):

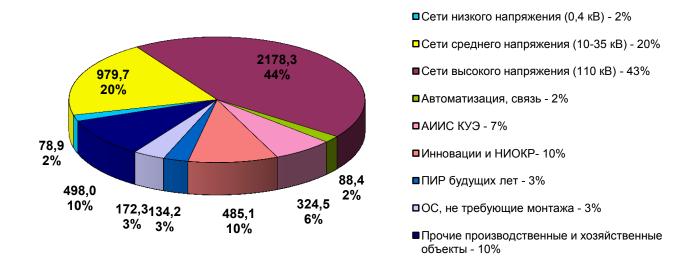

Инвестиционной программой ОАО «ДРСК» реализуются мероприятия, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей, для обеспечения энергоснабжения объектов саммита АТЭС-2012, технологическое присоединение новых потребителей электроэнергии, приобретение электросетевых объектов муниципальным образований в зоне действия ОАО «ДРСК».

На реализацию мероприятий по подготовке к саммиту АТЭС-2012 в ИПР 2011 г. запланировано 1 463 млн. руб., за 2011 г. выполнено работ на 1 353,1 млн. руб. (92%).

По технологическому присоединению потребителей на 2011 г. запланировано 35 мероприятий на 571,9 млн. руб. За отчетный период освоено 686,6 млн. руб. (120%).

В рамках мероприятий по выкупу муниципальных сетей за 2011 г. приобретено 740,38 км линий электропередач и 111,63 МВА трансформаторной мощности, в т.ч.:

- 160,8 км ЛЭП, 59 шт. ТП 6-10/0,4 кВ общей мощностью 13,4 МВА в Сковородинском районе Амурской области на сумму 9,6 млн. руб.;
- 348 км ЛЭП, 134 шт. ТП 6-10/0,4 кВ общей мощностью 29,5 МВА в Магдагачинском районе Амурской области на 21,4 млн. руб.;
- 220,8 км ЛЭП, 143 шт. ТП 6-10/0,4 кВ общей мощностью 46,4 МВА г. Зея Амурской области на 45,5 млн. руб.;
- 3,2 км ЛЭП в с. Ивановка, 0,7 км ЛЭП в с. Владимировка;
- 1 км ЛЭП и ТП 6-10/0,4 кВ мощностью 0,16 МВА на территории «Мухинского интерната» в с. Ключевое;
- ПС 35/6 кВ «Индустриальная» в г. Хабаровске мощностью 20 МВА;
- 3,4 км ЛЭП, TП 6-10/0,4 кВ мощностью 1,26 MBA в г. Биробиджане;
- 2,48 км ЛЭП, 3 шт. ТП 6-10/0,4 кВ общей мощностью 0,51 МВА в Октябрьском районе EAO.

В 2011 г. введено в эксплуатацию 1 237,5 км линий электропередач и 563,7 МВА трансформаторной мощности.

За отчетный период 2011 года стоимость основных фондов увеличилась на 3 461,8 млн. руб. (79 % от плана 4 358,9 млн. руб.) в том числе по филиалам ОАО «ДРСК»:

Наименование филиала:	Ввод основных с млн. руб.	%	
·	План	Факт	<del>_</del>
«Амурские ЭС»	915,1	901,3	98%
«Приморские ЭС»	2 558,8	1 612,4	63%
«Хабаровские ЭС»	466,4	582,7	125%
«ЭС EAO»	232,9	186,3	80%
«Южно-Якутские ЭС»	176,8	166,3	94%
общесистемные мероприятия	8,9	12,8	144%
ВСЕГО по Обществу	4 358,9	3 461,8	79%

Отклонение сложилось по следующим причинам:

### - ПС-110/35/10 кВ "Пушкинская" с заходами ЛЭП-110 кВ,

В виду изменений технических решений в процессе строительства и необходимостью корректировки ПСД, сроки ввода перенесены на 2 кв. 2012 г.

### - ПС-110/10 кВ "Казармы" с заходами ЛЭП-110 кВ:

В связи с изменением трассы прохождения ЛЭП и увеличением сроков строительства, ввод объекта в эксплуатацию перенесен на 2 кв. 2012 г.

## - Заходы ВЛ 110 кВ на ПС 220 кВ «Зеленый угол»:

В виду изменений технических решений в процессе строительства, связанных с изменением компановки ОРУ-110 кВ на ПС Зеленый угол, сроки ввода перенесены на 3 кв.  $2012~\Gamma$ .

#### - ПС-110/35/6 кВ «Бурная» с заходами КЛ 110 кВ:

- ✓ длительные сроки решения вопроса по выделению земельного участка для размещения подстанции (более 9 месяцев);
- ✓ крайняя стесненность земельного участка, примыкающего к действующей подстанции «Металлист»;
- ✓ мероприятия по устройству временного электроснабжения и переподключению потребителей;
- ✓ необходимость полной реконструкции существующей ПС-35 кВ «Металлист» (в здании подстанции «Металлист» размещаются ЗРУ-6 кВ и ОПУ подстанции «Бурная»);
- ✓ отсутствие технологической возможности организации одновременного выполнения строительно-монтажных работ по всем конструктивам подстанции «Бурная».
- Реконструкция распределительных сетей 10/0,4 кВ г. Облучье (13 км). В связи с невыполнением договорных обязательств подрядчиком ОАО «Дальтехэнерго» не введен в эксплуатацию объект, работы перенесены на 2012 год.

В 2011 году фактическое финансирование составило — 5 408,1 млн. руб. с НДС (94%) при плане — 5 771,3 млн. руб. с НДС.

Денежные средства направлены на погашение кредиторской задолженности за выполненные работы и поставку оборудования, произведенные в 2010 г. на расчеты за выполненные обязательства подрядчиками и поставщиками оборудования, материалов, согласно условиям заключенных договоров.
