

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
по производству-главный инженер
Корчеман С.Н.
« 10 » _____ 2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подключение заявителей в п. Волчанец

1. Общие сведения:

1.1. Основанием строительства ВЛ-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ и ВЛ-0,4 кВ для тех. присоединения к сетям 6/0,4 кВ является договор на технологическое присоединение к сетям ОАО «ДРСК» Приморские электрические сети:

1.1.1. № 11-3858 от 21.10.2011 г. (Амельчя А.С. «База отдыха», расположенная в Приморском крае, п. Волчанец, в 310 м на юго-восток от ориентира дом по ул. Набережная, 22.)

2. Объект торгов:

2.1. Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ согласно п. 1.1.1.

3. Мероприятия необходимые для подключения:

3.1.1 Строительство ВЛ-6 кВ от оп. № 13 фид. № 9 ПС 110/35/6 кВ Волчанец до проектируемого КТП 6/0,4 кВ, строительство КТП 6/0,4 кВ строительство ВЛ-0,4 кВ согласно Приложению 1.1.

4. Основные характеристики сооружаемого объекта.

Таблица 2

Показатель	Значение
Мощность потребителя	≤100 кВт
Номинальное напряжение	0,4 кВ; 6 кВ
ВЛ-6 кВ: протяженность.	Определить на стадии проектирования
Конструктивные особенности по типу опор, проводу и изоляции.	Определяются проектом по действующим нормативам, в т.ч. согласно Приложению 1. Для ВЛ-0,4 кВ опоры ж/б применить с изгибающим моментом не менее 30 кН, для ВЛ-6 кВ – не менее 50 кН.. Приобретение арматуры и СИП осуществить в соответствии с ГОСТ 52373-2005
Наличие переходов через естественные и искусственные преграды	Определить на стадии проектирования
Число часов использования максимума нагрузки	Согласно расчета.
Наличие и длина кабельных вставок	Определить на стадии проектирования
Трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ, тип, мощность	ТМ-6/0,4 кВ 250 кВА , коммутационный аппарат 0,4 кВ расчетного номинала.

5. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

5.1. Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87)

5.2. ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.

5.3. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

5.4. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

5.5. Положение о технической политике ОАО «ДРСК».

5.6. «Уточнение карт климатического районирования территории Приморского и Хабаровского краев по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

5.7. Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

5.8. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

6. Объем выполняемых проектных работ и документация:

6.1. Разделы рабочей документации выполнить в объеме, достаточном для выполнения СМР. Разделы проектно-сметной документации выполнить соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87).

6.2. Картографический материал представить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

6.3. Выполнить сбор исходных данных, в объеме, необходимом для строительства (реконструкции) объекта.

6.4. Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации.

6.5. Сметная документация должна соответствовать требованиям «Регламента формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО «ДРСК».

6.6. Сметная стоимость объекта строительства должна определяться согласно действующим положениям методических документов (МДС 81) по сметно-нормативной базе в строительстве, в редакции 2008-2009 гг.

6.7. Сметная документация составляется в базисном, текущем и прогнозном уровне цен с применением базисно-индексного метода с использованием территориальных единичных расценок для Приморского края (ТЕР-2001 в редакции 2009г.) по программе Гранд СМЕТА. Индексы изменения сметной стоимости СМР применяются в соответствии с рекомендациями РЦЦС (Приморского регионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов). Индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» применяются в соответствии с ежеквартальными письмами Минрегионразвития РФ. Стоимость строительства формируется с учетом поквартальных индексов-дефляторов Минрегионразвития РФ. Сметные расчеты выполнить с учетом требований «Перечня и методов определения затрат, необходимых для расчетов сметной документации».

6.8. По завершению проектирования Подрядчик направляет ПСД Заказчику на согласование и утверждение (в электронном виде и на бумажном носителе).

6.9. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

Вид документа	Используемое приложение	Формат
Текстовая часть, описания	MS Word и	.doc

	Adobe Acrobat	.pdf
Таблицы	MS Excel и Adobe Acrobat	.xls .pdf
Базы данных	MS Excel и Adobe Acrobat	.xls .pdf
Планы, графики	MS Project и MS Excel	.mpp .xls
Чертежи	AutoCAD и Adobe Acrobat	.dwg .pdf
Графический материал	MS Photo Editor и Adobe Acrobat	.jpg .pdf
Электронный архив	WinRar	.rar *
Сметная документация	MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам.	.xls .gsf

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

6.10. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

7. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения строительно-монтажных работ (уточняются проектом):

7.1. Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования (материалов) согласовать с Заказчиком.

7.2. Материалы и оборудование, предоставляемые Подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

8. Требования к выполнению работ:

8.1. Строительство выполняется на основании договора подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

8.2. Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

8.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

8.4. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектным решениям, строительным норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

8.5. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТ РМ-016-2001, гл. 13.

8.6. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

9. Требования к Подрядной организации:

9.1. Отсутствие у подрядной организации просроченных обязательств в части выполнения работ по уже заключенным с филиалом ОАО «ДРСК» «Приморские ЭС» (или ОАО «ДРСК») договорам подряда.

9.2. Устойчивое финансовое состояние, подтвержденное бухгалтерским балансом за предыдущий период, справкой о прибылях и убытках и т.п.

9.3. Наличие свидетельства, полученного в СРО, о допуске к видам работ по пунктам из перечня работ Приказа Минрегиона РФ №624 от 30.12.2009 г. (конкретные пункты по проектированию и СМР выбираются из данного перечня с той же нумерацией согласно конкретному объему работ в техническом задании).

9.4. Подрядчик обеспечивает на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

9.5. Подрядчик обеспечивает получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и конструкций, проезда машин, и т.п.). Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

9.6. Персонал должен быть обучен, иметь соответствующую квалификацию и опыт выполнения работ аналогичных объекту торгов.

9.7. Работники, направляемые для выполнения работ, должны быть подготовлены к работе в действующих электроустановках и иметь права командированного персонала (включая права выдачи нарядов), в соответствии с требованиями ПОТРМ-016-2001.

9.8. Обеспечение предприятия Подрядчика производственной базой или временными помещениями для размещения персонала и хранения материалов, инструмента, оборудования, наличие собственного, арендованного или находящегося на других законных основаниях производственного оборудования, инструмента, транспорта и т.п.

10. Приемка выполненных работ:

10.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

10.2. Подрядчик письменно, и по телефону, не позднее, чем за пять дней до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.

10.3. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

10.4. Приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

10.5. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл. 1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. Приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

11. Сроки выполнения работ:

Начало работ — с момента заключения договора.

Окончание работ — 30 июля 2012 г.

12. Гарантии исполнителя:

Гарантия Подрядчика на своевременное и качественное выполнение работ, материалы и оборудование, а также на устранение дефектов, возникших по его вине, составляет не менее 36-ти месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки.

13. Заказчик: ОАО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»


14. Ответственные лица:

12.1. Непосредственно с объемами и визуально с объектами на местах можно ознакомиться у начальника Партизанского участка СП ПЮЭС, с. Новицкое ул. Садовая, 1А (тел. (8-42365-25-225), pures@prim.drsk.ru, по общим вопросам и организации работ в целом - у руководителя СП Южные электрические сети филиала ОАО «ДРСК» - «Приморские ЭС» Беспалова Е.В. в г. Владивостоке, ул. Стрелковая, 19-23 (тел. 8(4232) 26-99-60)

**Заместитель директора по развитию
и инвестициям филиала
«Приморские ЭС»**


В.А. Скаредин

**Зам. главного инженера по ПР и ТП
филиала «Приморские ЭС»**


А.С. Боровский

Начальник СЭ


Е.В. Голубков



"Утверждаю"

Директор СП ПЮЭС

Беспалов Е.В.

23 04

2012г.

Ведомость объёмов работ (дефектная ведомость)

«23» апреля 2012г.

I 1. Заявитель: Амельчя А. С.

2. Месторасположение ЭПУ заявителя: п. Волченец 310м на Ю-В от дома 22 по ул. Набережная

3. Заявленная мощность, категория надёжности и уровень напряжения 100 кВт, III кат., 380 В

4. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: НЕТ

5. Предполагаемая точка подключения: ВЛ-6кВ Ф- 9 ПС "Волченец " опора №13


6. Расстояние до сетей-0,4кВ ОАО «ДРСК» по прямой линии 450м

7. Объём работ:

№ пп	Наименование работ и затрат, единица измерения	Тип, параметры	Количество
1. Строительно-монтажные работы			
1.1. Строительство ВЛ 6(10) кВ			
1,1,1	Проектирование ВЛ-0,4кВ (м)		450
1,1,2	Установка опор (1 опора)	одностоечных	3
		с одним уклоном	4
1,1,3	Установка покоса к существующей ж/б опоре (шт)		1
1,1,4	Подвеска провода (м)	АС-50	1400
1.2. Строительство ВЛ 0,4 кВ			
1,2,1	Установка опор	с одним уклоном	1
1,2,2	Подвеска провода (м)	СИП4х70	20
1.3. Установка КТПН			
1,3,1	Установка КТП 6(10)/0,4 кВ (1 КТП)	КТП 6(10)/0,4 кВ	1
1.4. Демонтажные работы			
2. Материалы			
2.1. ВЛ-6 кВ			
2,1,1	Стойка железобетонная (шт)	СВ-110	12
2,1,2	Траверса (шт)	ТМ-3	3
	Хомут (шт)	Х-1	3
2,1,3	Полураверса (шт)	М-9 (М2)	15
2,1,4	Изолятор (шт)	ПС-70	48
2,1,5	Изолятор (шт)	ШС-10	30
2,1,6	Колпачок	КВ-22	30
2,1,7	Провод (м)	АС-50	1400
2,1,8	Крепление уклона (шт)	У-3	5
2,1,9	Линейная арматура (компл.)	СР-7-16	27
		У1-7-16	27
		СК-7-16	27
		НKK-1-1Б	27
2,1,10	Плашечный зажим	ПС1-1	8

2.2. ВЛ-0,4 кВ			
2,2,1	Стойка железобетонная (шт)	СВ-95	2
2,2,2	Крепление укоса (шт)	У-3	1
2,2,3	Провод (м)	СИП4х70	20
2,2,4	Анкерный кронштейн (шт)	СА 2000	1
2,2,5	Анкерный клиновый зажим (шт)	РА1500	1
2,2,6	Монтажная лента (м)	F-20.07	2
2,2,7	Скрепа для монтажной ленты (шт)	С20	2
2,2,8	Кабельный ремешок (шт)	KR 1	4
2,2,9	Зажим плашечный (шт)	ПС 1-2	1
2,2,10	Крепление з/проводника (шт)	KZP-2	1
2,2,11	Заземляющий провод (шт)	ЗП-1М	1
2,2,12	Заземляющий спуск. Сталь круглая (кГ)	d-12мм	7
2,2,13	Вертикальный электрод. Уголок (кГ)	50х50х5	10
2,2,14	Изолирующие колпачки	СИ 25-150	4
2,2,15	Плашечный зажим	ПА2-2	4
3. Оборудование			
3,1	Песчано гравийная смесь (м3)		3
3,2	Фундамент (шт)	Ф/блок ФС-30	4
3,3	КТП киоскового типа с воздушным вводом(шт)	КТПН-250/6/0,4	1
3,4	Силовой трансформатор (шт)	ТМ-250/6	1
3,5	Разъединитель в комплекте. (узел крепления разъединителя, узел крепления привода, привод.)	РЛНД1-10/400	1
3,6	Труба (кГ)	d-25мм	15
3,7	Заземление КТП (кГ)	Ст. угловая 5х50х50	106
		Ст.полосовая 4х40	88
3,8	Провод (м)	СИП4х70	20
3,9	Герметичные изолированные наконечники	СРТАУ 70	4
3,10	Гофра		6
3,11	Электроды сварочные (кГ)	МР-4 Ф4мм.	5

9. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

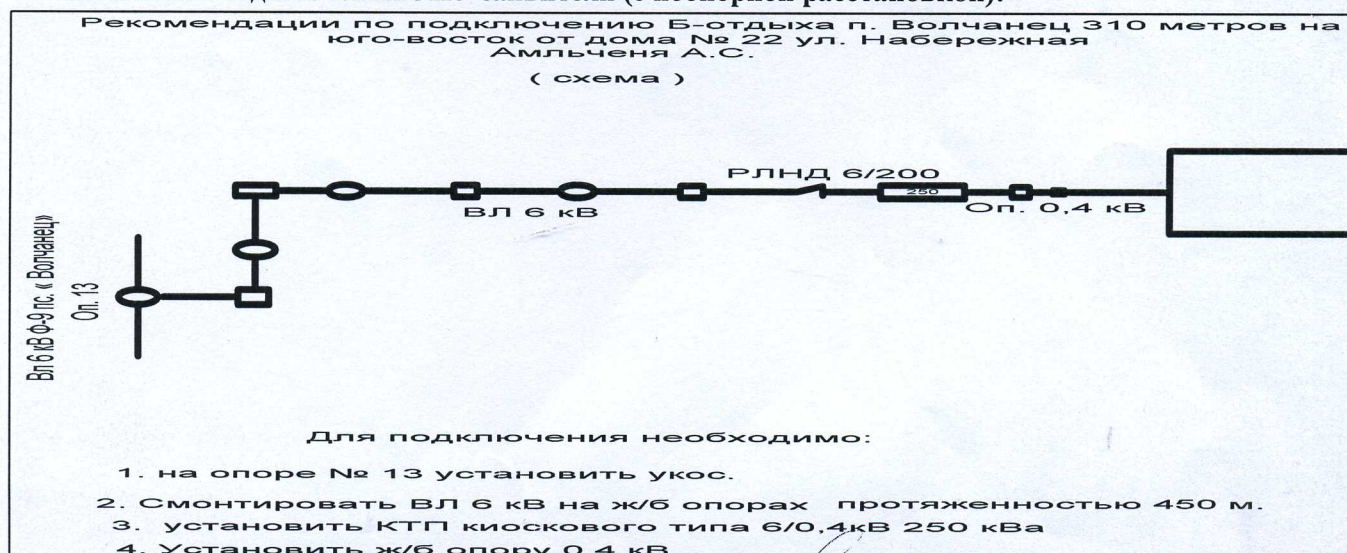

Начальник ППРЭС

Ковалёв А.В.

Начальник ПТС

Крутяков В.В.
